Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Ekspropriation Næsbjerg-Nordenskov**	**136 dage**	**ma 20-03-17**	**ma 09-10-17**
2	**Ekspropriation**	**136 dage**	**ma 20-03-17**	**ma 09-10-17**
3	Varsling af lodsejere vedr. opmåling	10 dage	ma 20-03-17	fr 31-03-17
4	Opmåling	10 dage	ma 03-04-17	fr 14-04-17
5	Skitse projektering	6 dage	ma 17-04-17	ma 24-04-17
6	PT - bemyndiger ekspropriation	0 dage	to 04-05-17	to 04-05-17
7	Offentliggørelse på hjemmesiden og i Pressen	9 dage	fr 05-05-17	lø 13-05-17
8	Indvarsling til åstedsforretning	4,2 uger	ma 15-05-17	ma 12-06-17
9	Afsætning til åstedsforretning	2 dage	to 08-06-17	fr 09-06-17
10	Afholdelse af Åstedsforretning	0 dage	ti 13-06-17	ti 13-06-17
11	Indsigelses periode i mod Åstedsforretning	4,2 uger	on 14-06-17	on 12-07-17
12	PT - godkender Åstedsforretningen	0 dage	to 10-08-17	to 10-08-17
13	ØK - Indstiller til Byrådet 1. behandling	0 dage	on 23-08-17	on 23-08-17
14	ØK - Indstiller til Byrådet 2. behandling	0 dage	on 30-08-17	on 30-08-17
15	Byrådet godkender endelig ekspropriation	0 dage	on 06-09-17	on 06-09-17
16	Meddelelse til lodsejere	0 dage	fr 08-09-17	fr 08-09-17
17	Klagefrist	4,2 uger	ma 11-09-17	ma 09-10-17

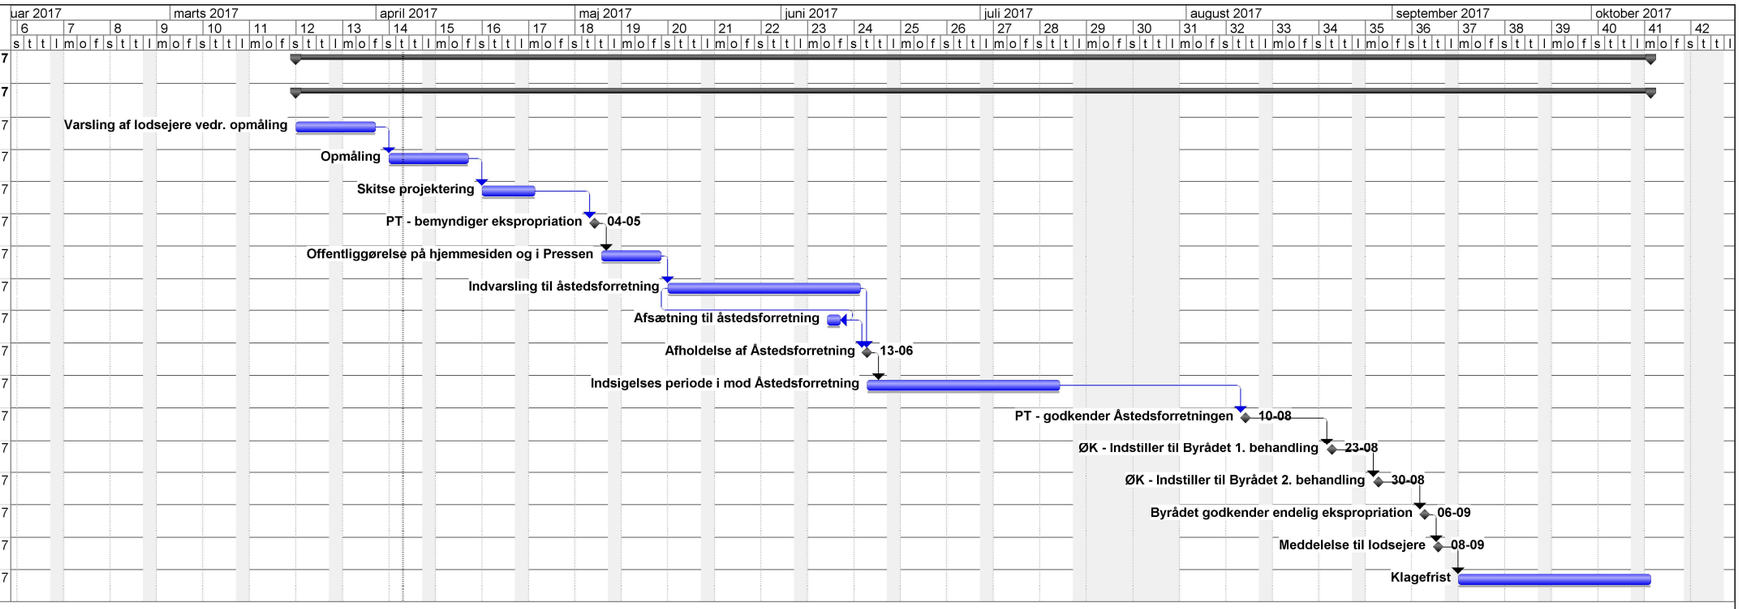

Bilag 3
Projekt: Ekspropriationstidsplan 2
Dato: on 05-04-17

Opgave | Fremdrift | Oversigt | Eksterne opgaver | Deadline
Opdeling | Milepæl | Projektoversigt | Ekstern milepæl

november 2017 | december 2017 | januar 2018 | februar 2018 | marts 2018 | april 2018 | maj 2018 | juni 2018 | juli 2018 | august 2018 | september 2018 | oktober 2018

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

m o f s t t l

Bilag 3
Projekt: Ekspropriationstidsplan 2
Dato: on 05-04-17

Opgave | Fremdrift | Oversigt | Eksterne opgaver | Deadline
Opdeling | Milepæl | Projektoversigt | Ekstern milepæl
